


**Карточка проекта**  
**Оптимизация процесса информирования о деятельности МАДОУ детский сад №3 «Радуга»**  
**Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики**  
**в VK сообществе**

**УТВЕРЖДАЮ**


Руководитель проекта \_\_\_\_\_ А.Н.Албутова

<b>Вовлечённые лица и рамки проекта</b>			<b>Обоснование выбора</b>
<p><b>Заказчик проекта:</b> коллектив МАДОУ детский сад №3 «Радуга»  <b>Владелец процесса:</b> заведующий МАДОУ детский сад №3 «Радуга» Албутова А.Н.  <b>Процесс:</b> Оптимизация процесса информирования о деятельности ДОУ/МАДОУ детский сад №3 «Радуга» Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики в VK сообществе  <b>Границы процесса:</b> от события до размещения публикации  <b>Периметр проекта:</b> VK сообщество МАДОУ детский сад №3 «Радуга»  <b>Руководитель проекта:</b> заведующий МАДОУ детский сад №3 «Радуга» Албутова А.Н.  <b>Команда проекта:</b>  Заведующий МАДОУ детский сад №3 «Радуга» Албутова Анна Николаевна  Старший воспитатель Молокова Галина Фёдоровна  Воспитатель Саванина Татьяна Анатольевна</p>			<p><b>Ключевой риск:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Большие затраты при подготовке публикации (сбор материалов, обработка, размещение).</li> <li>2. Большое количество обрабатываемых в процессе материалов.</li> <li>3. Высокая периодичность повторения процессов.</li> <li>4. Низкая мотивация педагогов в подготовке материалов.</li> </ol> <p><b>Проблемы:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Низкое качество предоставляемого материала от педагогов до публикации.</li> <li>2. Недостаточная информированность родителей о деятельности ДОУ.</li> </ol> <p><b>Ценность для заказчика:</b> целенаправленное непрерывное повышение уровня профессиональной компетенции педагогов при подготовке материалов для публикации в VK сообществе детского сада.</p>
<b>Цели и плановый эффект:</b>			
<b>Наименование цели, ед. изм.</b>	<b>Текущий показатель</b>	<b>Целевой показатель</b>	<p><b>Ключевые события проекта:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Старт проекта</b> - 01.08.2023 - 04.08.2023</li> <li>2. <b>Диагностика и разработка целевого состояния процесса:</b>  Разработка текущей карты процесса - 14.08.2023-16.08.2023  Разработка целевой карты процесса – 22.08.2023 - 25.08.2023  Разработка плана реализации проекта - 26.09.2023 - 31.08.2023</li> <li>3. <b>Проведение совещания по запуску проекта</b> – 01.09.2023</li> <li>4. <b>Внедрение улучшений</b> - 04.09.2023 – 30.09.2023</li> <li>5. <b>Закрепление результатов</b> – 02.10.2023 – 30.01.2024</li> <li>6. <b>Закрытие проекта</b> – 31.01.2024</li> </ol>
Сокращение времени на подготовку публикации	180 мин.	60 мин.	
Повышение качества предоставляемых материалов	0-5 шт.	10 шт.	
Сокращение количества доработок текста	2-3 раза	0 раз	
<p><b>Эффекты:</b>  Ожидаемая экономия средств от минимизации временных затрат администратора страницы VK сообщества МАДОУ детского сада №3 «Радуга» - 210 руб. в день - 50400 руб. в год</p>			

# 1. Карта текущего состояния процесса

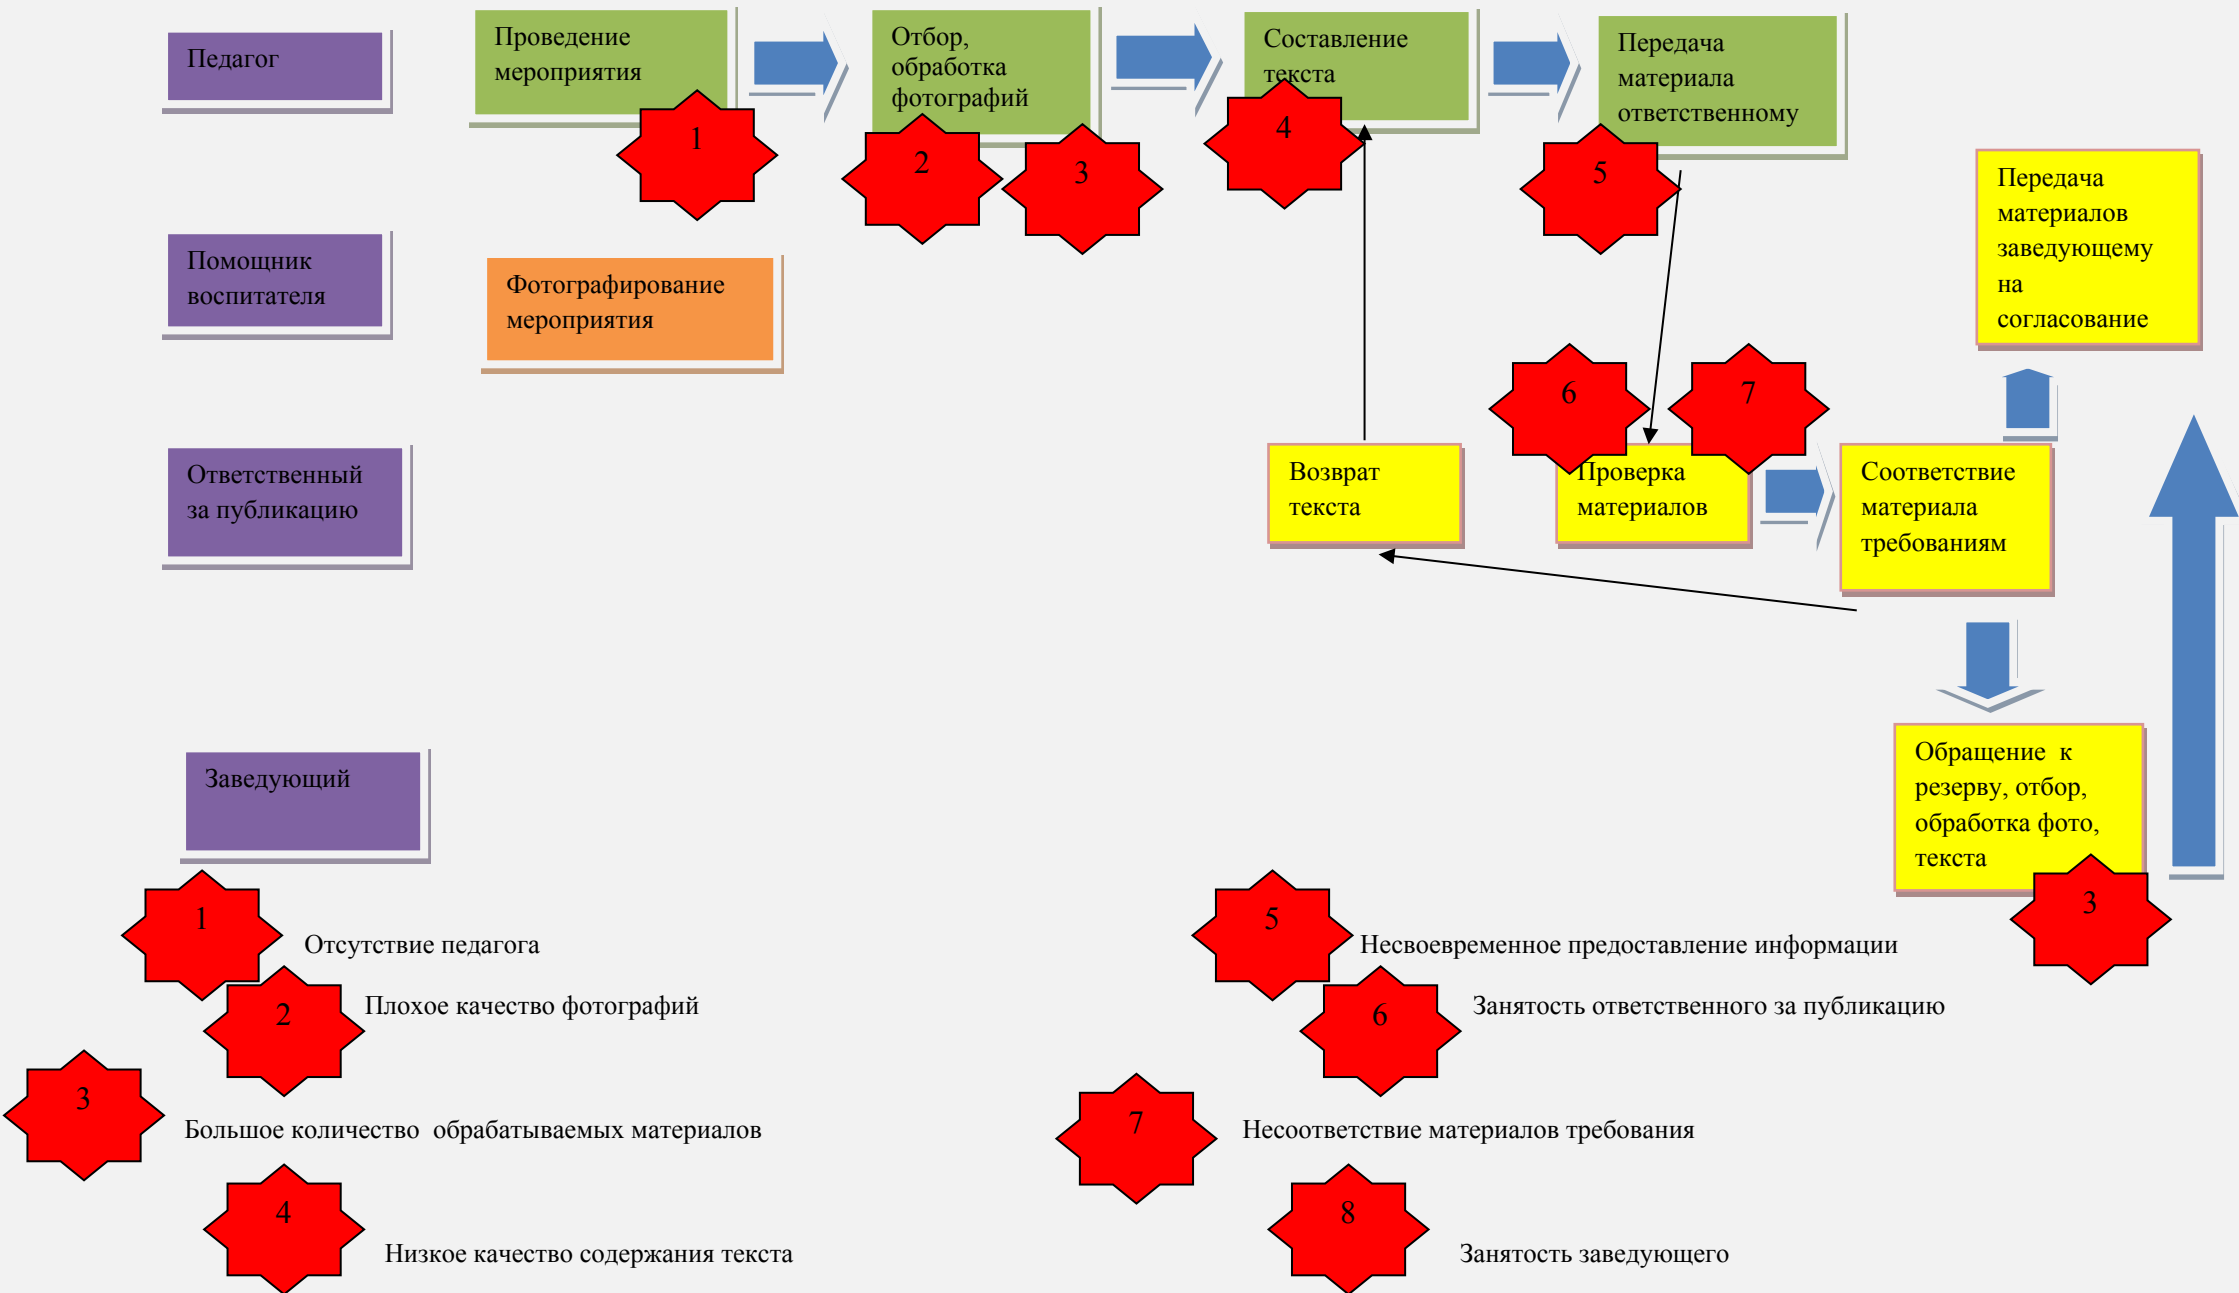


# 1. Карта текущего состояния процесса (продолжение)

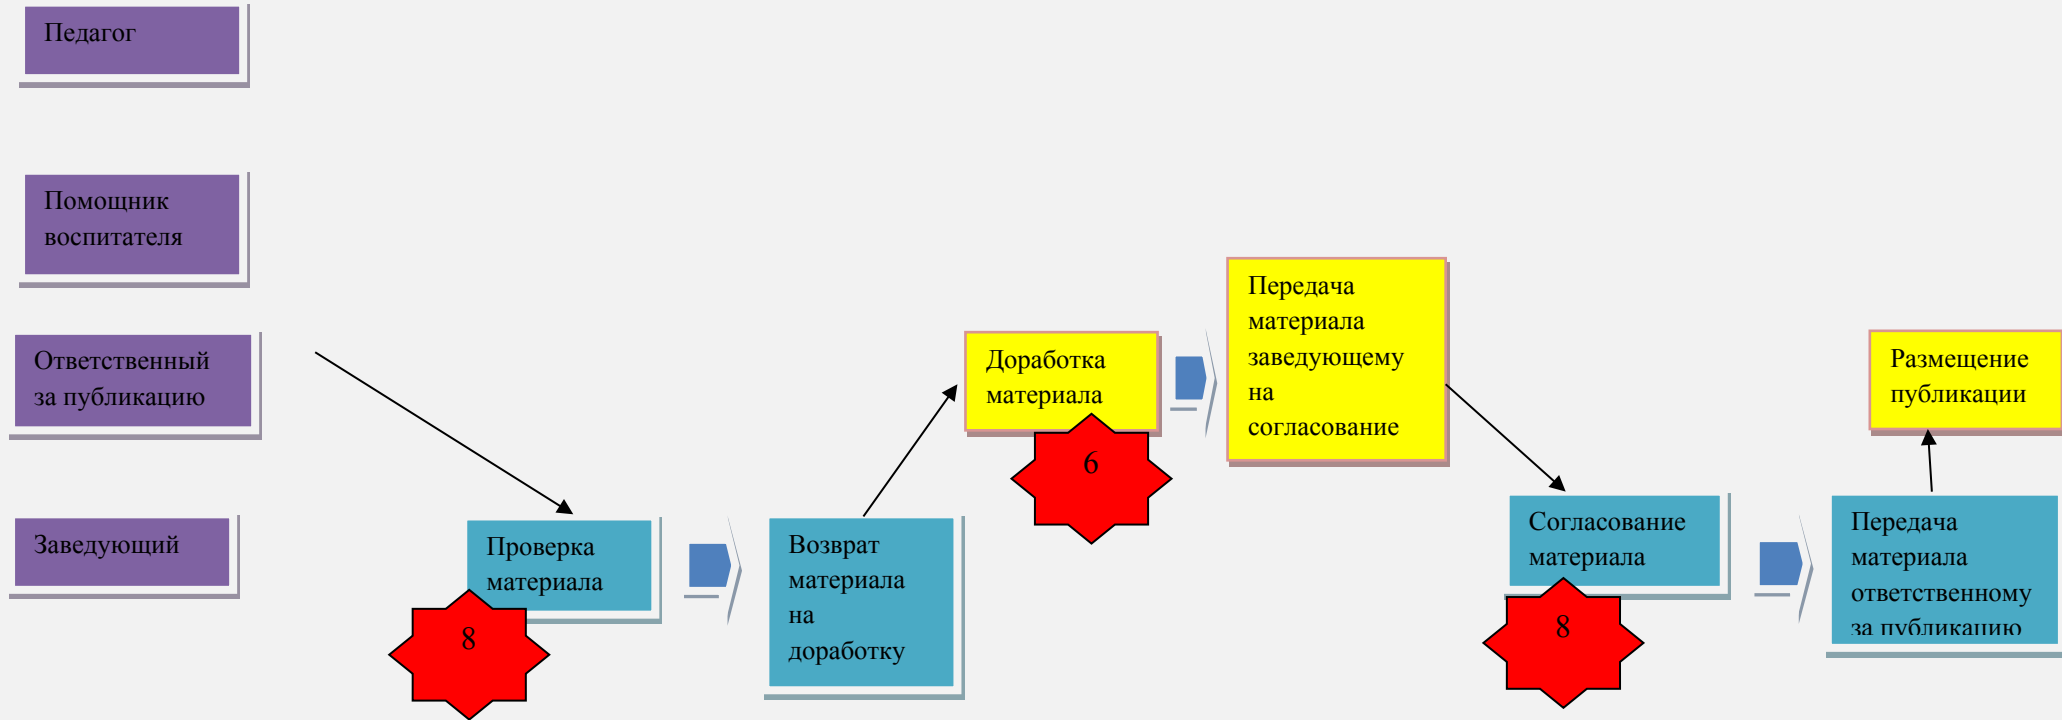

ВПП - 180 мин.

# 1. Карта целевого состояния процесса

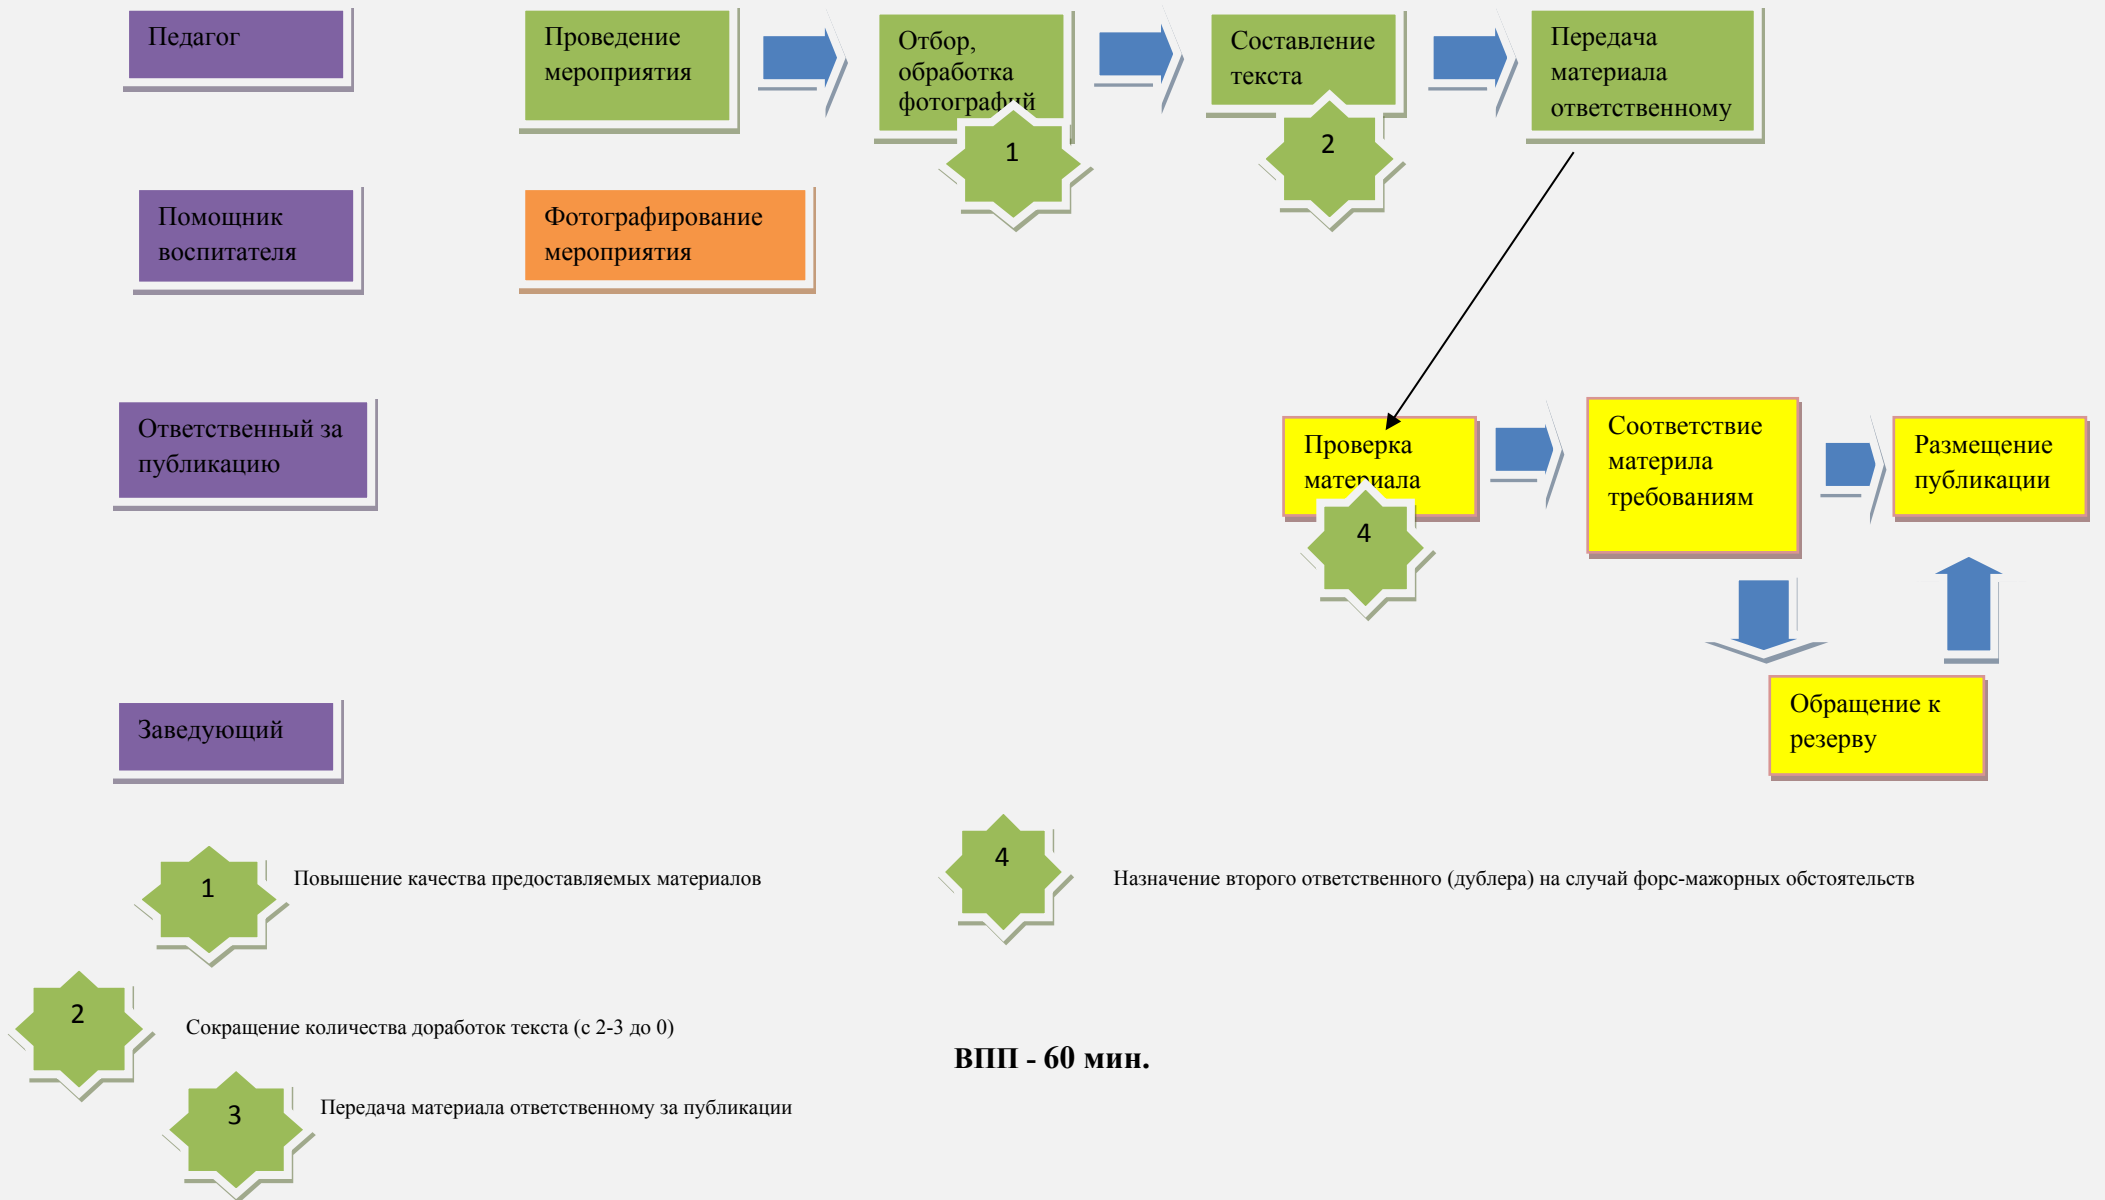

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель проекта \_\_\_\_\_ А.Н. Албутова

01.09.2023

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

#### По оптимизации процесса информирования о деятельности МАДОУ детский сад №3 «Радуга» Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики в ВК сообществе

№ п/п	Описание проблемы	Мероприятия по решению проблем	Ожидаемые результаты	Ответственные исполнители	Сроки выполнения мероприятий
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Плохое качество фотографий</li> <li>2. Большое количество обрабатываемых материалов</li> <li>3. Низкое качество содержания текста</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Мозговой штурм «Что делает фото удачным?»</li> <li>2. Мастер-класс «Основы фотосъемки»</li> <li>3. Деловая игра «Я редактор»</li> <li>4. Ограничение по количеству (10-12 фото)</li> <li>5. Подготовка чек-листа «Я редактор» (требования к содержанию текста публикации для самопроверки)</li> <li>6. Рекомендуемые образцы текста</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Повышение качества предоставляемых материалов</li> <li>2. Единообразие стиля публикаций</li> <li>3. Сокращение количества доработок текста (с 2-3 до 0)</li> <li>4. Снижение количества орфографических ошибок</li> <li>5. Ориентация на интересы родителей</li> </ol>	Педагоги	04.09.2023-30.09.2023
2.	Несвоевременное предоставление материала	График предоставления материалов (с указанием даты, времени, темы)	Соблюдение графика публикаций	Педагоги Ответственный за публикацию	04.09.2023 30.01.2024
3.	Низкая мотивация педагога при подготовке материала	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Конкурс «Лучший пост месяца» (с публикацией результатов в ВК сообществе)</li> <li>2. Введение параметров материального стимулирования</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Повышение материальной заинтересованности</li> <li>2. Равномерное распределение нагрузки</li> <li>3. Повышение самооценки педагогов</li> <li>4. Повышение имиджа педагога</li> <li>5. Расширение представлений педагогов о формах самопрезентации</li> </ol>	Заведующий	04.09.2023 31.05.2024
4.	Занятость ответственного за публикации	Делегирование/закрепление полномочий согласования материала за ответственным за публикации	Своевременное размещение публикации	Заведующий	04.09.2023 30.01.2024
5.	Технические проблемы	Назначение второго ответственного (дублера) на случай форс-мажорных обстоятельств	Своевременное размещение публикации	Заведующий	04.09.2023 30.01.2024

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель проекта \_\_\_\_\_ А.Н.Албутова

31.01.2024

**ОТЧЁТ**

**о результатах эффективного использования ресурсов образовательной организации в рамках реализации ФГОС ДО  
путём создания полифункционального помещения в МАДОУ детский сад №3 «Радуга»  
Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики**

<b>Наименование целевых показателей, характеризующих достижение цели реализации проекта</b>	<b>Текущее значение</b>	<b>Целевое значение</b>	<b>Фактически достигнутое значение</b>
Сокращение времени на подготовку публикации	180 мин.	60 мин.	120 мин.
Повышение качества предоставляемых материалов	5 шт. качественных фотографий	10 шт. качественных фотографий	8 шт. качественных фотографий
Сокращение количества доработок текста	2-3 возврата	0 возвратов	1 возврат
Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год	50400 руб. в год		
Повышение информированности родителей о деятельности детского сада	Постоянно		
