

## Карточка проекта


### По оптимизации процесса подготовки к праздничным мероприятиям за счёт сокращения временных и материальных затрат на оформление музыкального зала путём использования тематических занавесов

УТВЕЖДАЮ


Руководитель проекта \_\_\_\_\_ А.Н. Албутова

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p style="text-align: center;"><b>Вовлечённые лица и рамки проекта</b></p> <p><b>Заказчик проекта :</b> коллектив МАДОУ детский сад №3 «Радуга»<br/> <b>Владелец процесса:</b> заведующий МАДОУ детский сад №3 «Радуга»<br/> <b>Процесс:</b> Оптимизация процесса оформления музыкального зала МАДОУ детский сад №3 «Радуга» Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики<br/> <b>Границы процесса:</b> рабочее время музыкального руководителя с ноября по апрель<br/> <b>Периметр проекта:</b> музыкальный зал детского сада<br/> <b>Руководитель проекта:</b> заведующий МАДОУ детский сад №3 «Радуга» Албутова Анна Николаевна<br/> <b>Команда проекта:</b><br/> Музыкальный руководитель Шарипов Наиль Салимович<br/> Музыкальный руководитель Саванина Татьяна Анатольевна<br/> Музыкальный руководитель Петрова Регина Наилевна<br/> Заведующий хозяйством Гибатдинова Гузелия Фазыльяновна</p> | <p style="text-align: center;"><b>Обоснование выбора</b></p> <p><b>Ключевой риск:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Снижение качества по художественно - эстетическому образованию детей из-за потерь, не связанных с непосредственным проведением образовательного мероприятия.</li> <li>2. Регулярные расходы на приобретение канцелярских товаров на разовое тематическое оформление музыкального зала.</li> </ol> <p><b>Проблемы:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Дефицит и потеря рабочего времени музыкальных руководителей для изготовления декорационных элементов .</li> <li>2. Недолговечность и однократное использование изготовленных декоративных элементов.</li> </ol> <p><b>Ценность для заказчика:</b><br/> Реализация проекта способствует повышению уровня освоения воспитанниками образовательной программы по художественно - эстетическому направлению, более качественному выполнению должностных обязанностей музыкальных руководителей детского сада и сокращению денежных затрат на оформление музыкального зала к праздничным мероприятиям.</p> |  |
| <b>Цели и плановый эффект:</b>  |  |  |
| <b>Наименование цели, ед. изм.</b>  | <b>Текущий показатель</b>  | <b>Целевой показатель</b>                    |
| Оптимизации процесса подготовки к праздничным мероприятиям за счёт сокращения временных затрат на оформление музыкального зала  | 12,92% рабочего времени<br>(55,8 мин в день)   | 4,58 % рабочего времени<br>(19,8 мин в день) |
| Оптимизации процесса подготовки к праздничным мероприятиям за счёт сокращения материальных затрат на оформление музыкального зала   | 18 000 руб.  | 6000 руб.                                    |
| <p><b>Эффекты:</b><br/> -ожидаемая экономия средств от минимизации временных затрат музыкальных руководителей 15012 руб. за 6 мес.<br/> - ожидаемая экономия от минимизации денежных затрат учреждения на покупку канцтоваров 12 тыс. за 6 мес.</p>   |  |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Ключевые события проекта:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Старт проекта.</b> – 02.10.2023 – 06.10.2023</li> <li>2. <b>Диагностика и разработка целевого состояния процесса:</b><br/> Разработка карты текущего состояния процесса - 09.10.2023-12.10.2023<br/> Разработка карты целевого состояния процесса – 16.10.2023 – 20.10.2023<br/> Разработка плана мероприятий по реализации процесса – 23.10.2023 – 03.11.2023</li> <li>3. Проведение совещания по запуску проекта – 06.11.2023</li> <li>4. Внедрение улучшений 06.11.2023 – 31.01.2023</li> <li>5. Закрепление результатов 01.02.2023 – 28.02.2023</li> <li>6. Закрытие проекта – 29.03.2023</li> </ol>   |  |  |

# 1. Карта текущего состояния процесса

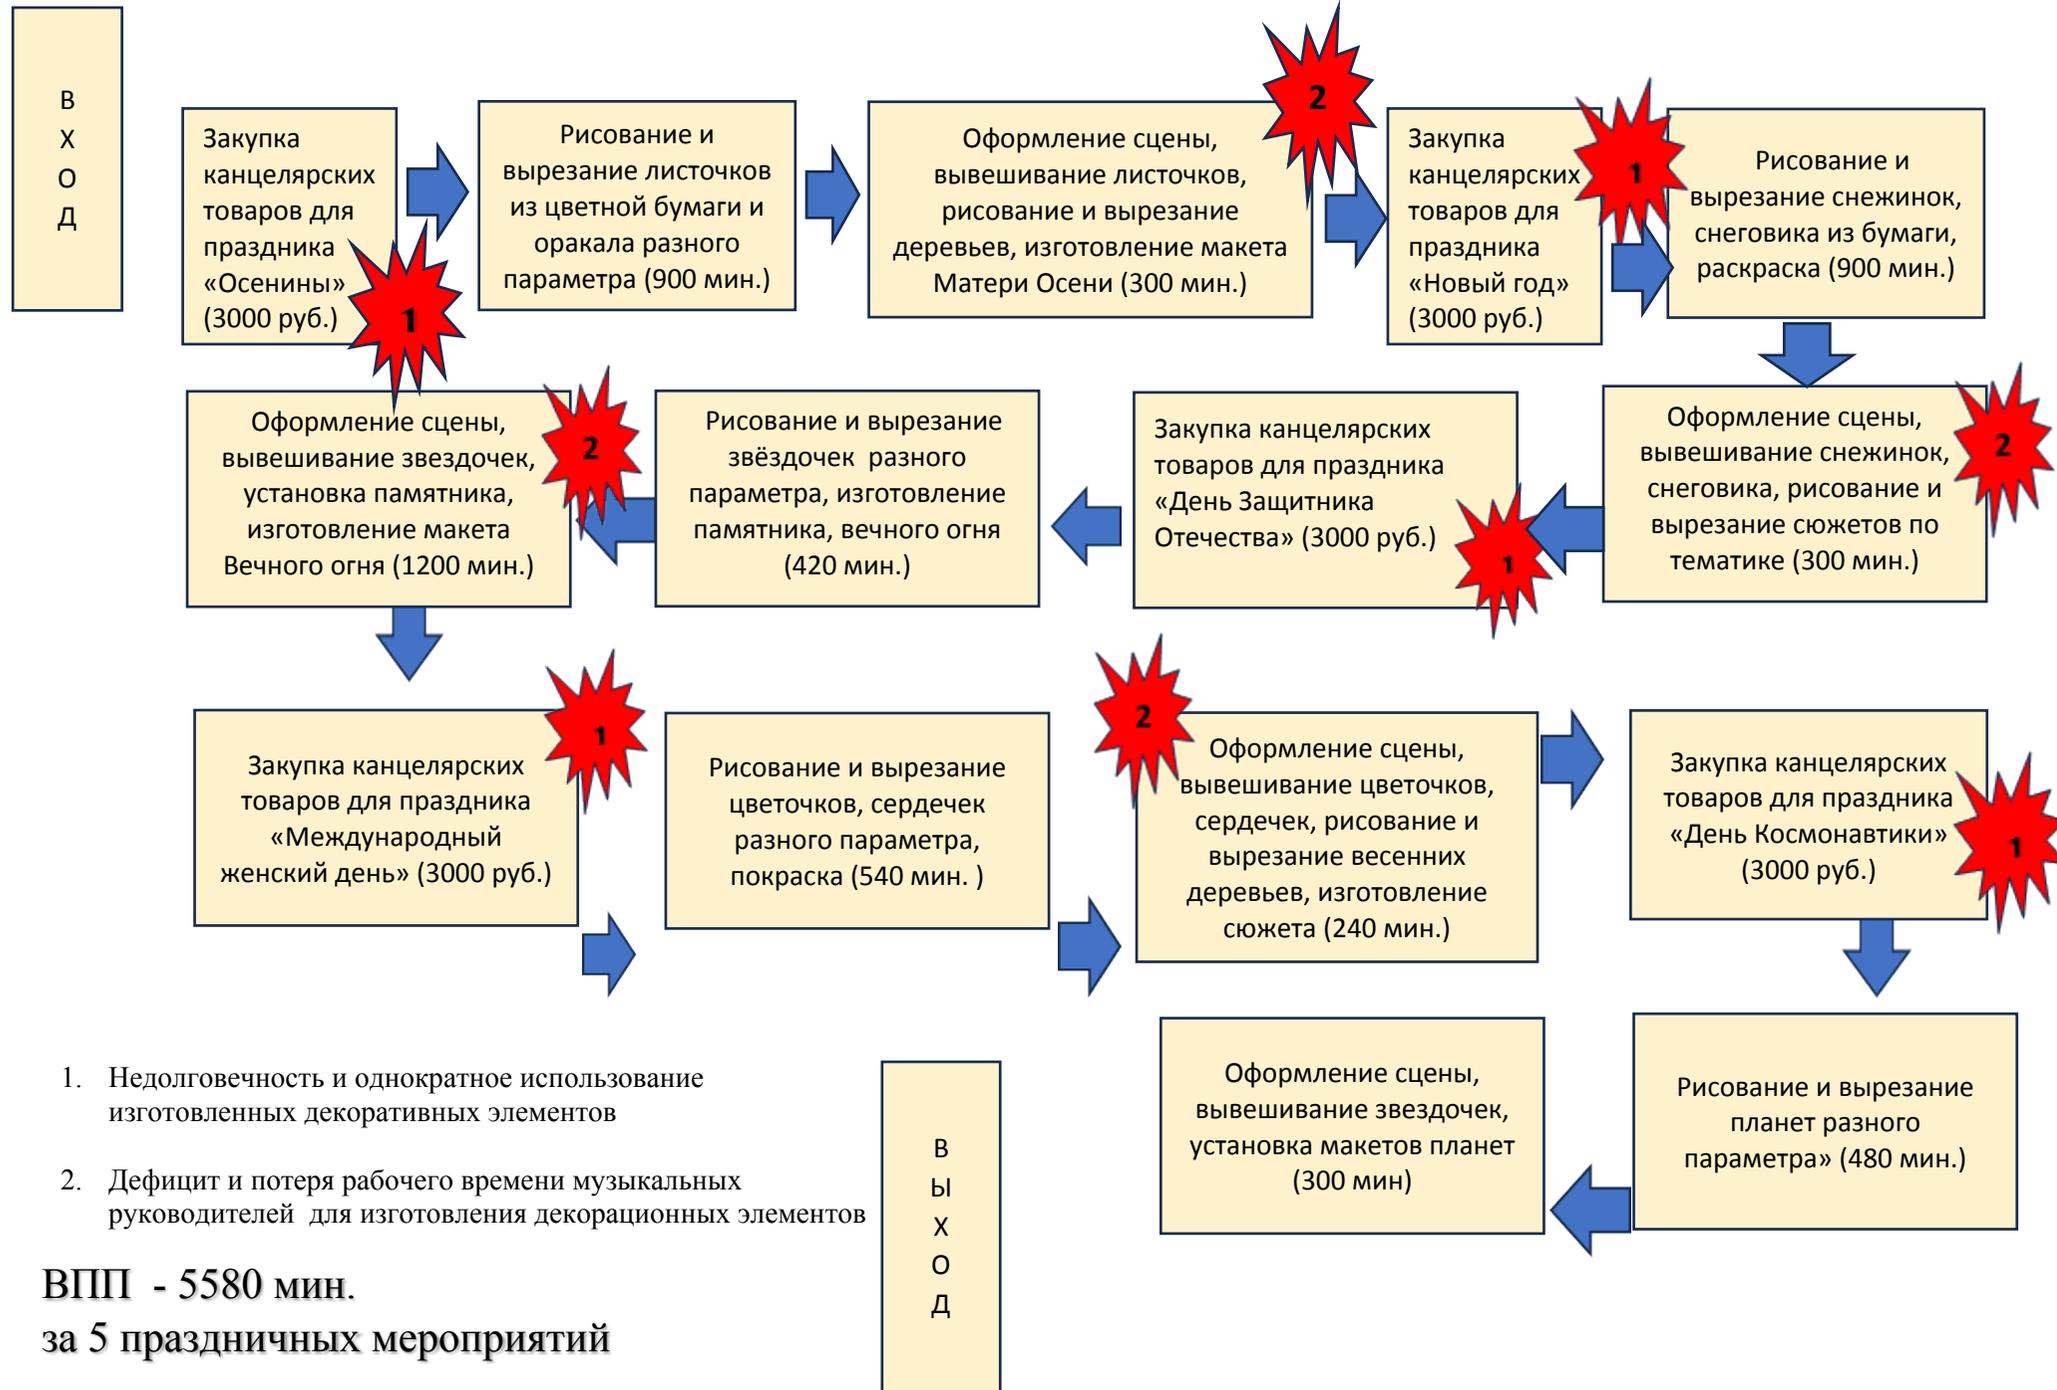

## 2. Карта целевого состояния процесса

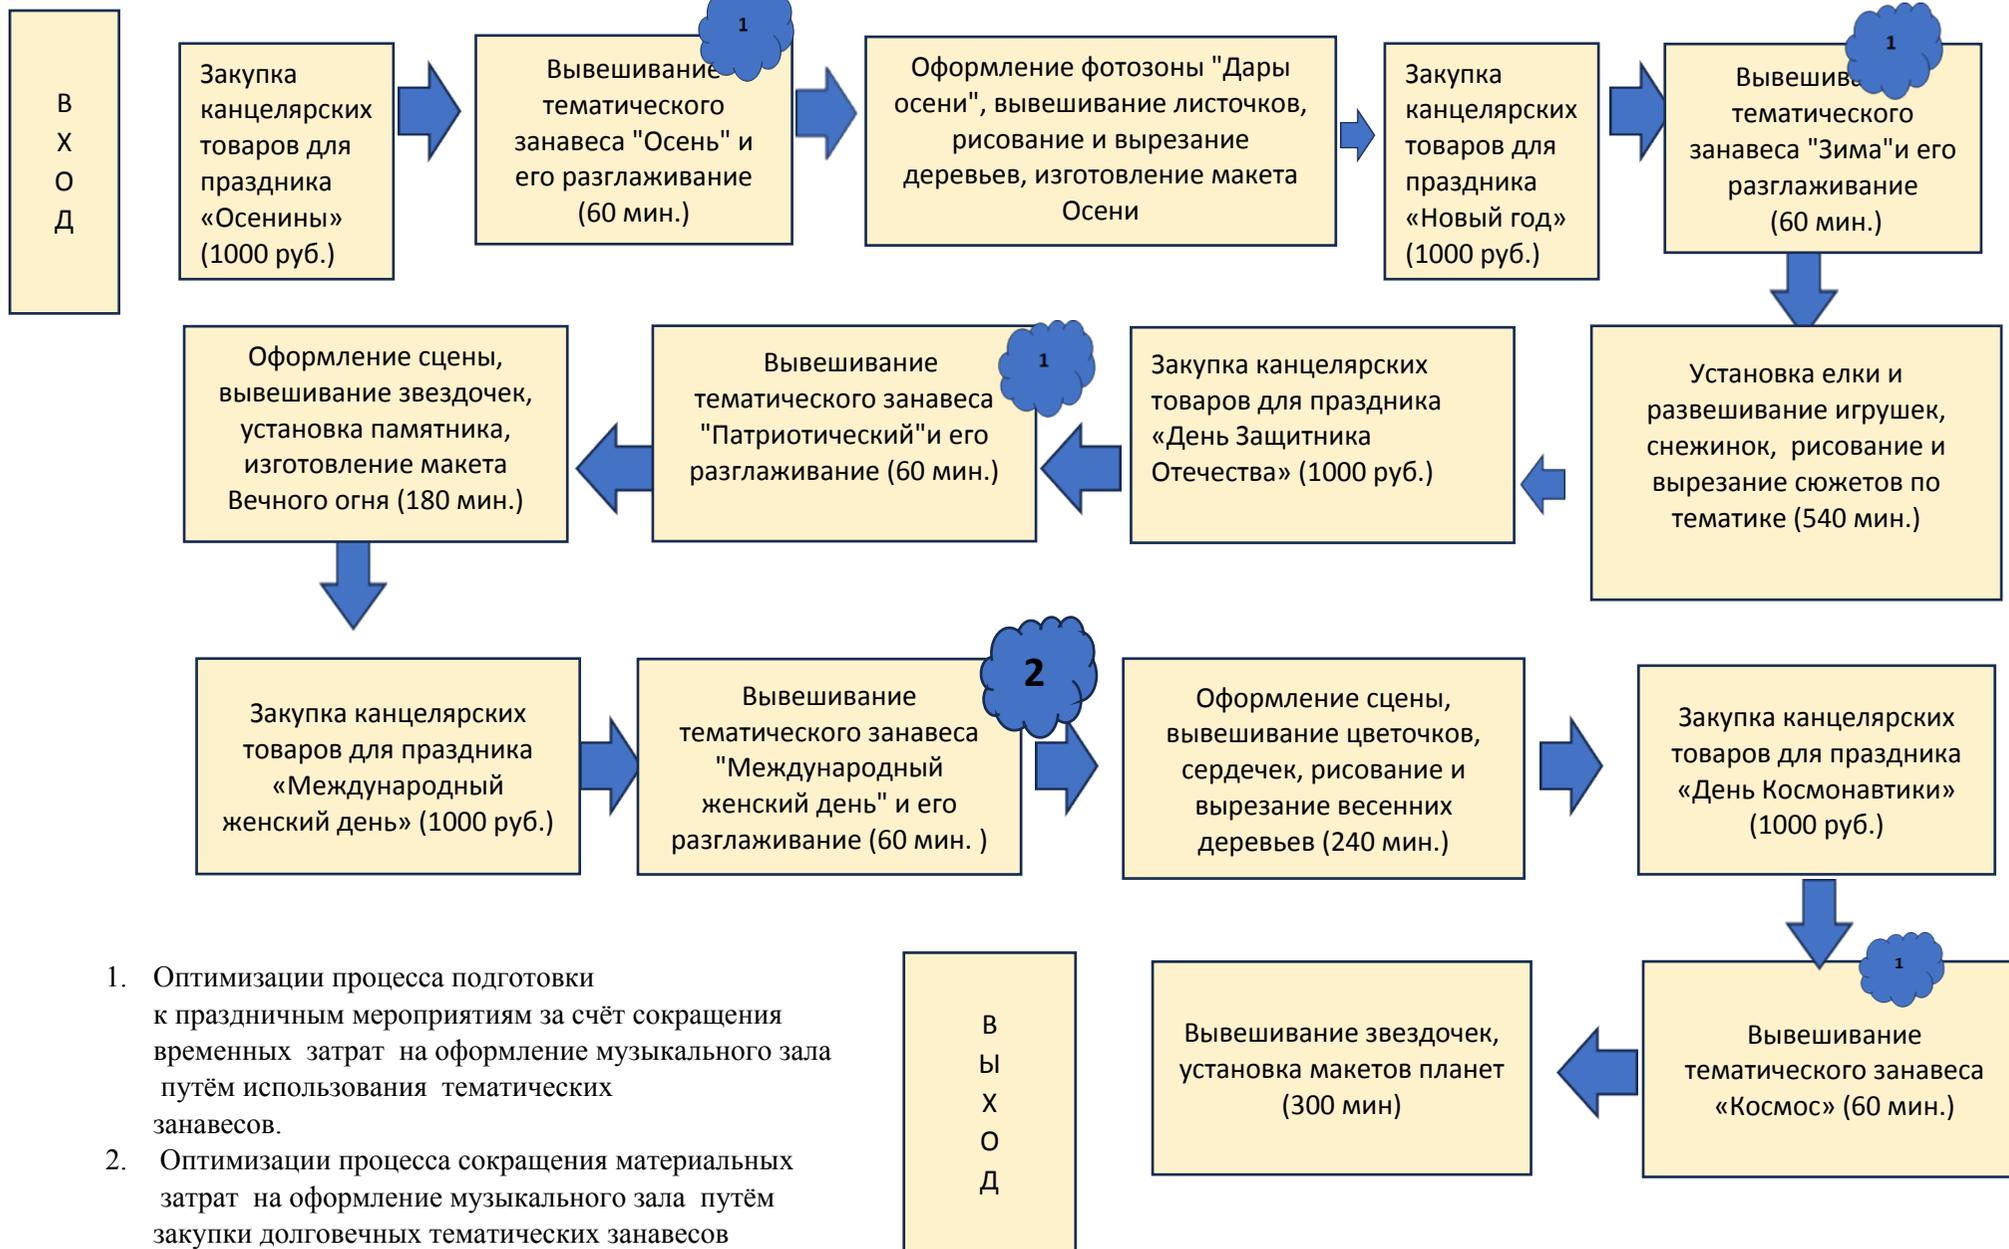

1. Оптимизации процесса подготовки к праздничным мероприятиям за счёт сокращения временных затрат на оформление музыкального зала путём использования тематических занавесов.
2. Оптимизации процесса сокращения материальных затрат на оформление музыкального зала путём закупки долговечных тематических занавесов многократного пользования

ВПП – 1980 минут за 5 праздничных мероприятий

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

**по реализации проекта по оптимизации процесса подготовки к праздничным мероприятиям за счёт сокращения временных и материальных затрат на оформление музыкального зала путём использования тематических занавесов**

| № п/п | Описание проблемы  | Мероприятия по решению проблем  | Ожидаемый результат  | Ответственные исполнители                                   | Сроки выполнения мероприятий<br>Месяц выполнения               |
|-------|--|---|--|---|--|
| 1     | Недолговечность и однократное использование изготовленных декоративных элементов                     | 1.Создание творческой группы для выбора вариантов решения проблемы.   | Оптимизации процесса подготовки к праздничным мероприятиям за счёт сокращения временных затрат на оформление музыкального зала путём использования тематических занавесов. | Заведующий, заведующий хозяйством, музыкальные руководители | 6 ноября 2023 г.   |
|       |  | 2.Создание и подбор макетов тематических занавесов «Осень», «Зима», составление технических заданий для закупки.  |  |   | 6 - 10 ноября 2023 г.  |
|       |  | 3.Закупка тематических занавесов «Осень», «Зима»,   |  |   | 16 -26 ноября 2023 г.  |
|       |  | 4.Создание и подбор макетов тематических занавесов «Патриотический», "Международный женский день", «Космос», составление технических заданий для закупки. |  |   | 9 января 2024 – 14 января 2024 г.                              |
|       |  | 5.Закупка тематических занавесов «Осень», «Зима», «Патриотический», "Международный женский день", «Космос»  |  |   | 14 января – 24 января 2024 г.                                  |
| 2     | Дефицит и потеря рабочего времени музыкальных руководителей для изготовления декорационных элементов | 1.Создание хронометража подготовки музыкальных руководителей к праздничным мероприятиям   | Оптимизации процесса сокращения материальных затрат на оформление музыкального зала путём закупки долговечных тематических занавесов.                                      | Заведующий, заведующий хозяйством, музыкальные руководители | 30 ноября 2023 г.,<br>29 декабря 2023 г.,<br>31 января 2024 г. |
|       |  | 2.Анализ расходов рабочего времени и материальных затрат.   |  |   | 29 декабря 2023 г.,<br>29 февраля 2024г.                       |

## ОТЧЁТ

**о результатах реализации проекта по оптимизации процесса подготовки к праздничным мероприятиям за счёт сокращения временных и материальных затрат на оформление музыкального зала путём использования тематических занавесов**

| Наименование целевых показателей, характеризующих достижение цели реализации проекта   | Текущее значение  | Целевое значение | Фактически достигнутое значение |
|--|---|------------------|---------------------------------|
| Оптимизации процесса подготовки к праздничным мероприятиям за счёт сокращения временных затрат на оформление музыкального зала путём использования тематических занавесов. | 55,8 мин. в день  | 19,8 мин. в день | 36 мин. в день                  |
| Оптимизации процесса сокращения материальных затрат на оформление музыкального зала путём закупки долговечных тематических занавесов многократного пользования             | 18000 руб.  | 6000 руб.        | 12000 руб.                      |
| Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год  | 27 012 руб. в год<br><br>(36 мин. = 187,5 руб. в день 1 муз. рук * 1,5 ставки = 281,25 руб. в день. 27012 руб. в год по учреждению) |                  |                                 |
